

**Техническое задание
(описание объекта закупки)
Блок-контейнер из сэндвич-панелей**

- 1. Заказчик:** Акционерное общество «Водоканал» г. Чебоксары.
- 2. Место поставки товара:** д. 35А, пр. Ленина, г. Чебоксары, Чувашская Республика.
- 3. Сроки поставки товара:** Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора.
- 4. Виды и объемы поставка товаров.**

Блок-контейнер из сэндвич панелей – 1 (одна) штука.

5. Назначение: Для размещения оборудования и расходных емкостей (3 шт. по 1 куб. м.) для вторичного хлорирования питьевой воды раствором гипохлорита натрия.

6. Основные технико – экономические показатели

Размеры контейнера 4000x2450x2450(h) мм (наружный).

Количество помещений – 1 (одно).

Размеры внутренние: 3800 x 2250 мм.

Количество дверей – 1.

Количество окон – 2.

Срок эксплуатации – 10 лет.

7. Конструктивные решения и материалы блок-контейнера

Каркас блок-модуля: Металлоконструкции блок-модулей представляют собой изделия, выполненные из профилей.

Основание каркаса (верхняя обвязка) – швеллер по расчету нагрузок;

Основание каркаса (нижняя обвязка) - швеллер по расчету нагрузок;

Перекрышки нижней обвязки – швеллер по расчету нагрузок;

Вертикальные угловые стойки – сложно – гнутый угол;

Обработан грунт эмалью RAL 5005 (сигнальный синий) (или аналог).

Стены:

Наружная стена – сэндвич панели не менее 100 мм. Минеральная вата;

Наружный цвет – RAL 5005 (сигнальный синий) (или аналог).

Внутренний цвет – RAL 9003 (сигнальный белый) (или аналог).

Крыша односкатная (уклон – вправо (при виде на дверь не менее 10 град.). Панель покрытия – сэндвич-панель с мембраной 1,2 мм.

Теплоизоляция – минеральная (каменная) вата не менее 100 мм;

Основание: несущее.

Предполагаемая нагрузка на основание: до 3 т.

Теплоизоляция – минеральная вата не менее 100 мм;

Покрытие пола – Фанера ламинированная 18 мм, финишное покрытие – герметичная ПВХ плитка, устойчивая к воздействию гипохлорита натрия.


Оконные блоки: Окно ПВХ 800х800 двухкамерное, одностворчатое, поворотно-откидное.

Дверь металлическая, утеплённая – 1 шт.

Размеры двери – 2000 х 1200 х 90 (мм).

Антикоррозионная защита металлических поверхностей контейнера должна быть выполнена в заводских условиях.

8. Примерная компоновка блок-контейнера:

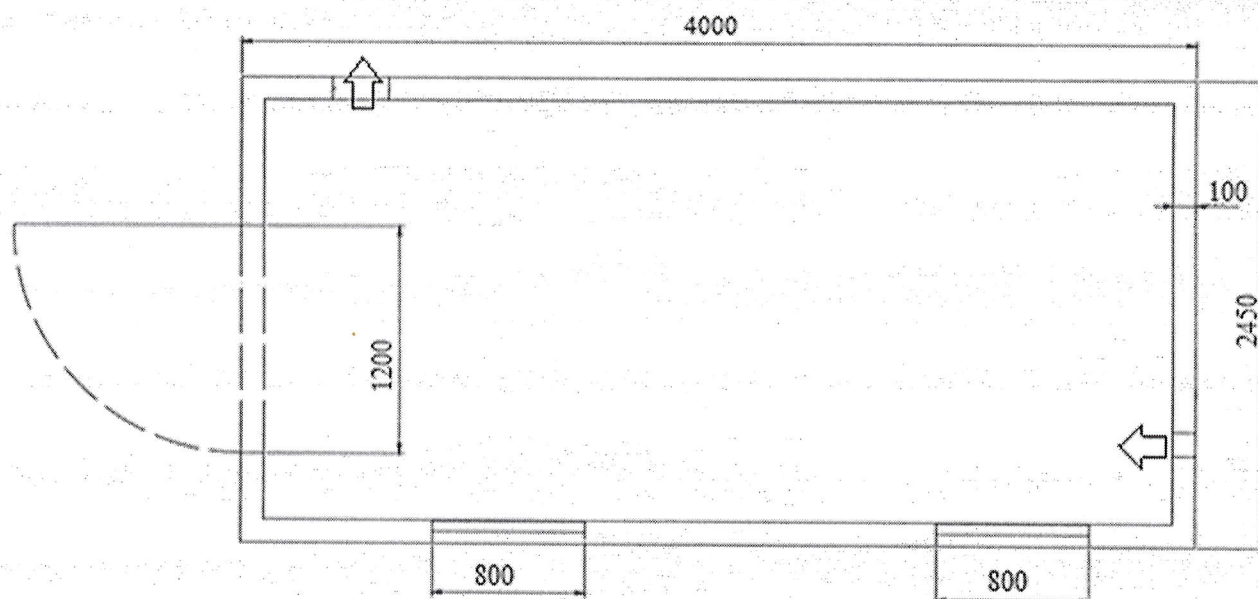

9. Инженерное обеспечение и технологическое оборудование

Подключение к внешним коммуникациям, монтаж электрического и другого оборудования, кроме вентиляции, Заказчик производит своими силами.

Вентиляция: Принудительная вытяжная, приток воздуха – через вентиляционные решетки. Решетки приточной вентиляции располагаются в нижней части контейнера. Решетки вытяжной вентиляции располагаются в верхней части контейнера.

10. Условия поставки товара:

Доставка Товара в адрес Заказчика, его разгрузка на объекте Заказчика осуществляется силами Поставщика и за его счет по адресу Заказчика.

При транспортировке должны обеспечиваться условия, необходимые для данного вида товара.

11. Качественные характеристики объекта закупки.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

12. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара.


Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее гарантийного срока производителя товара, при этом составлять не менее 24 месяцев. Гарантийный срок начинается со дня подписания Заказчиком документов о приемке. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в период гарантийного срока. При выходе товара из строя Поставщик обязан по требованию Заказчика в срок до 30 календарных дней восстановить работоспособность товара в полном объеме либо поставить Заказчику такой же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя.

Поставщик за свой счет обеспечивает вывоз неисправного товара с территории Заказчика, а также осуществляет последующую доставку отремонтированного или заменённого товара на территорию Заказчика. Вывоз товара осуществляет представитель Поставщика.

Разработал:


Главный инженер цеха ВСиС



В.В. Прахеев


Согласовано:

Заместитель главного инженера
(главный технолог)



Б.П. Шленсков

Главный инженер



А.А. Щепелев
